



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU

Pç. Leão Dehon, 50 - Centro - CEP 89184-000 Presidente Nereu- SC

CNPJ - 83.102.699/0001-28

Fone/fax (047) 3362-1108 e 3362-1115

www.presidentenereu.sc.gov.br

ADITIVO - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PERÍODO DE 01/07/2024 a 16/09/2024

VALOR: R\$ 26988,99

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS HEXAGONAIS DA RUA PADRE DONATO COM 253,38 METROS DE EXTENSÃO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU/SC, CUSTEADO COM RECURSOS FEDERAL ORIUNDO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PROGRAMA 09032023, EMENDA PARLAMENTAR 202328560020.

TOMADA DE PREÇO Nº 201/2023

EMPRESA EXECUTORA: TORRES PAVIMENTOS LTDA

LOCAL DA OBRA: Rua Padre Donato

Bairro Centro – Presidente Nereu/SC

Em vistoria realizada no local, foi constatado que as quantidades dos serviços medidos, foram devidamente executados. Conforme planilha de medição apresentada pela empresa.

Presidente Nereu, 17 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA CAROLINA EIFLER

Data: 17/09/2024 14:27:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA CAROLINA EIFLER
Eng.º Civil – CREA/SC 179461-9
Prefeitura Municipal de Presidente Nereu



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU

Pç. Leão Dehon, 50 - Centro - CEP 89184-000 Presidente Nereu- SC

CNPJ - 83.102.699/0001-28

Fone/fax (047) 3362-1108 e 3362-1115

www.presidentenereu.sc.gov.br

SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1.1 *Compactação mecânica, sem controle do GC (c/compactador placa 400 kg).*
- 1.2 *Execução e compactação de base e ou sub-base com brita graduada simples (com transporte).*
- 1.3 *Meio fio pré-moldado de concreto tipo2 (reto)6x6x30, com fornecimento e instalação.*
- 1.4 *Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 8 cm. Af_10/2022.*
- 1.5 *Caixa de junção em bloco de concreto p/tubos de DN 400mm, incluindo materiais e serviço.*
- 1.6 *Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/tubos DN 500mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro.*
- 1.7 *Tubo de concreto pré-fabricado d=0,20.*
- 1.8 *Tubo de concreto simples - ps2 nbr-8890 DN 400mm.*
- 1.9 *Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019.*
- 1.10 *Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm.af_10/2022.*
- 1.11 *Meio fio pré-moldado de concreto tipo1 (arredondado)(6x10) x10x30, com fornecimento e instalação.*
- 1.12 *Meio fio pré-moldado de concreto tipo2 (reto)6x6x30, com fornecimento e instalação.*
- 1.13 *Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 8 cm. Af_10/2022.*
- 1.14 *Pavimentação em blocos intertravados de concreto (paver vermelho podo tátil), espessura 6,0cm, fck35 MPA, assentados sobre areia média e=5cm, rejuntamento com agregado de granulometria média e=0,5cm, para alerta e direcional com fornecimento de materiais e colocação.*
- 1.15 *Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos sextavado - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU
Pg. Leão Dehon, 50 - Centro - CEP 89184-000 Presidente Nereu- SC
CNPJ - 83.102.699/0001-28
Fone/fax (047) 3362-1108 e 3362-1115
www.presidentenereu.sc.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 01: Placa de identificação da obra.



Imagem 02: Regularização e compactação de subleito de solo – prolongação da rua.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU

Pç. Leão Dehon, 50 - Centro - CEP 89184-000 Presidente Nereu- SC

CNPJ - 83.102.699/0001-28

Fone/fax (047) 3362-1108 e 3362-1115

www.presidentenereu.sc.gov.br



Imagem 03: Execução e compactação de base e ou sub-base com brita graduada simples – prolongação da rua.



Imagem 04: Meio fio pré-moldado de concreto tipo 1 (arredondado) (6x10) x10x30 – prolongamento da rua.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU

Pç. Leão Dehon, 50 - Centro - CEP 89184-000 Presidente Nereu- SC

CNPJ - 83.102.699/0001-28

Fone/fax (047) 3362-1108 e 3362-1115

www.presidentenereu.sc.gov.br



Imagem 05: Meio fio pré-moldado de concreto tipo 2 (reto) 6x6x30. Compactação mecânica, sem controle do GC e execução e compactação de base e ou sub-base com brita graduada simples – entradas das residências, lado direito.



Imagem 06: Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm – prolongamento da rua.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU

Pç. Leão Dehon, 50 - Centro - CEP 89184-000 Presidente Nereu- SC

CNPJ - 83.102.699/0001-28

Fone/fax (047) 3362-1108 e 3362-1115

www.presidentenereu.sc.gov.br



Imagem 07: Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural e paver vermelho podotátil e meio fio pré-moldado de concreto tipo 2 – prolongamento da rua.

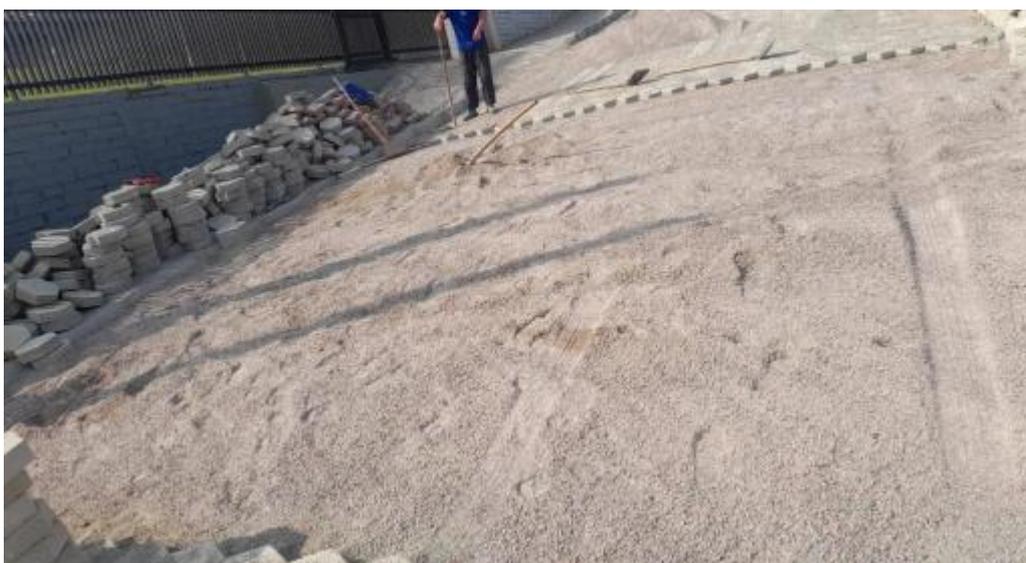


Imagem 08: Reassentamento de blocos sextavados – faixas elevadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU

Pç. Leão Dehon, 50 - Centro - CEP 89184-000 Presidente Nereu- SC

CNPJ - 83.102.699/0001-28

Fone/fax (047) 3362-1108 e 3362-1115

www.presidentenereu.sc.gov.br



Imagem 09: Compactação mecânica, sem controle do GC e execução e compactação de base e ou sub-base com brita graduada simples – prolongamento da rua.

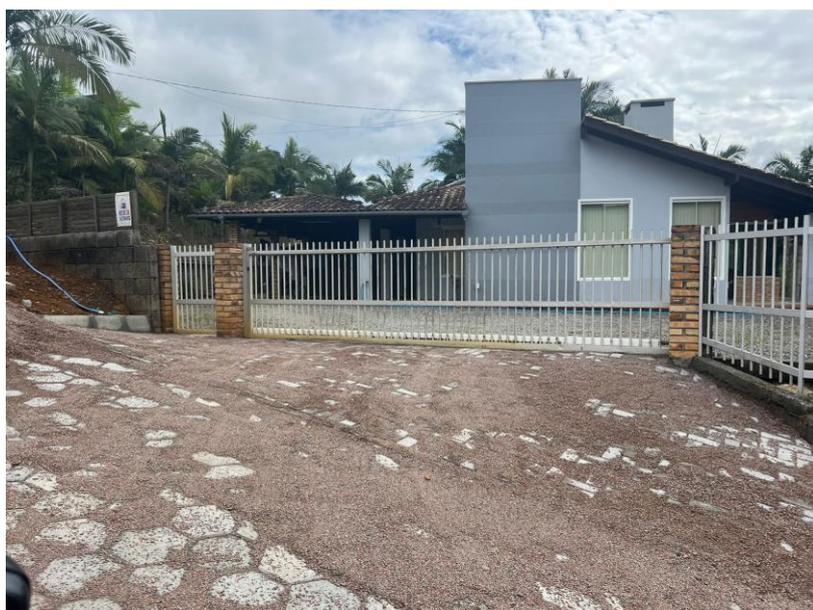


Imagem 10: Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural – entrada das residências, lado direito.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU
Pg. Leão Dehon, 50 - Centro - CEP 89184-000 Presidente Nereu- SC
CNPJ - 83.102.699/0001-28
Fone/fax (047) 3362-1108 e 3362-1115
www.presidentenereu.sc.gov.br

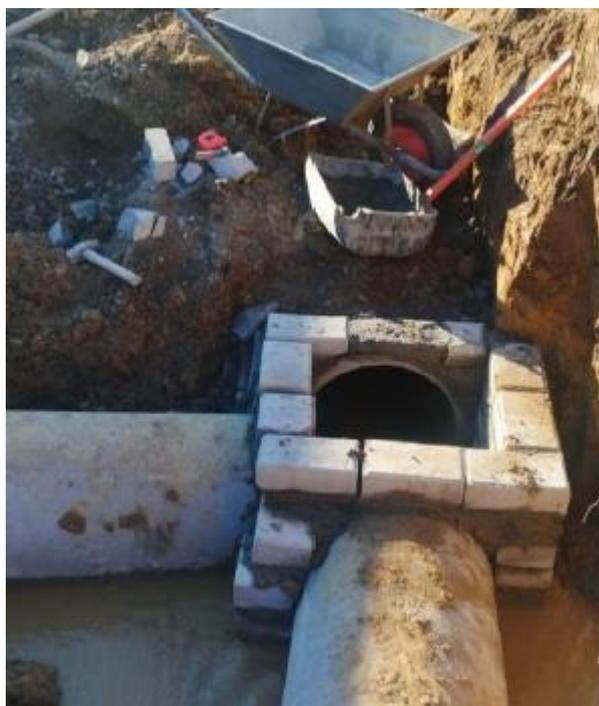


Imagem 11: Caixa de junção em bloco de concreto – drenagem.



Imagem 12: Caixa de captação com junção em alvenaria – drenagem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU

Pç. Leão Dehon, 50 - Centro - CEP 89184-000 Presidente Nereu- SC

CNPJ - 83.102.699/0001-28

Fone/fax (047) 3362-1108 e 3362-1115

www.presidentenereu.sc.gov.br



Imagem 13: Tudo de concreto D 400mm – prolongamento da rua.



Imagem 134: Tudo de concreto D 200mm – drenagem.
